



REPUBLIQUE DU SENEGAL

MINISTÈRE DE L'EAU ET
DE L'ASSAINISSEMENT



OFFICE NATIONAL DE L'ASSAINISSEMENT DU SÉNÉGAL

SITUATION D'EXECUTION DES PROJETS

PREMIER SEMESTRE 2021

Juillet 2021



Cité TP SOM N° 4 HANN BP. 13428 - DAKAR

Tél : 33 859 35 35 – Fax : 33 832 35 31

N° Orange : 818 00 10 12

Email : onas@onas.sn - Site web : www.onas.sn

TABLE DES MATIERES

PROJET DES BRANCHEMENTS SOCIAUX DANS LES VILLES ASSAINIES/PEAMU.....	4
PROJET DE SOUTIEN AU CHANGEMENT CLIMATIQUE CAMBERENE.....	5
PROJET D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DE GRAND YOFF.....	6
PROJET DE DEPOLLUTION NORD DE LA VILLE DE DAKAR.....	7
PROJET D'ASSAINISSEMENT DE LA CORNICHE OUEST.....	9
ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES A ZIGUINCHOR-PHASE PRIORITAIRE.....	10
PROJET D'ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE SAINT-LOUIS.....	11
PROJET DE DEPOLLUTION DE LA BAIE DE HANN.....	13
ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DE LA VILLE DE PIKINE /10 VILLES.....	16
ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DE LA VILLE DE RUFISQUE / 10 VILLES.....	17
ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DE LA COMMUNE DE CAMBERENE / 10 VILLES.....	18
ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DE LA VILLE DE LOUGA /10 VILLES.....	19
ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DE LA VILLE DE TIVAOUANE / 10 VILLES.....	21
ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DE LA VILLE DE KAOLACK / 10 VILLES.....	22
ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES DE TOUBA / 10 VILLES.....	23
ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DE TAMBACOUNDA / 10 VILLES.....	25

PROJET DES BRANCHEMENTS SOCIAUX DANS LES VILLES ASSAINIES/PEAMU

PROGRAMME	BAILLEUR	MONTANT (FCFA & %)	
Travaux de branchements sociaux à Dakar et dans les villes assainies	IDA	4 067 727 740	85%
	Etat du Sénégal	732 190 993	15%
	Total	4 799 918 733	100%

LOT 1

Entreprise	Date de notification OS	Date fin prévue	Date fin réelle
SINCO	02 mars 2018	Mars 2021	

Avancement des travaux/Marché de base	Prévisions	Réalisations	% Exécution
Réseaux eaux usées (ml) : KLK/TH/DK	93 059	91 291	98,5%
Branchements domiciliaires (u) : KLK/TH/DK	1800	1800	100%
Station de pompage (u)	01	0,99	99%
Total Avancement Travaux			99%

Avancement des travaux/Avenant 1	Prévisions	Réalisations	% Exécution
Modification STAP Ouest Foire	01	01	100%
Total Avancement Travaux			100%

Avancement. Financier /Entreprise	Prévisions	Réalisations	% Exécution
SINCO/Marché de base (mille FCFA HT)	4 067 727	3 986 373	98%
SINCO/Avenant1 (mille FCFA HT)	128 000	-	0%
Total financier (mille FCFA HT)	4 195 727	3 986 373	98%

Taux d'avancement	Financier	Technique
	98%	99%

Plan d'action
<ul style="list-style-type: none"> - Finaliser les tests de pression sur le refoulement et essais de mise en service de la station - Démarrer les tests d'écoulements et d'étanchéité du réseau, - Mise en service de la station - et Remise en état des lieux.

LOT 2

Entreprise	Date de notification OS	Date fin prévue	Date fin réelle
------------	-------------------------	-----------------	-----------------

SAHE SA	02 novembre 2020	06 Juillet 2021	
---------	------------------	-----------------	--

Avancement des travaux	Prévisions	Réalisations	% Exécution
Réhabilitation STAP Cité Mourtada	01	01	100%
Réhabilitation STAP Cité Grand Yoff	01	0,97	97%
Total Avancement Travaux			98%

Avancement. Financier	Prévisions	Réalisations	% Exécution
Sans objet (mille FCFA HT)	321 151	211 774	66%
Total financier (mille FCFA HT)	321 151	211 774	66%

Taux d'avancement	Financier	Technique
	66%	98%

Difficultés/Observations	Plan d'action
- Difficultés liées à l'obtention de l'autorisation de la traversée de chaussées.	<ul style="list-style-type: none"> - Essais et mise en service des équipements posés - Préparer la réception provisoire des travaux

PROJET DE SOUTIEN AU CHANGEMENT CLIMATIQUE CAMBERENE

PROGRAMME	BAILLEUR	MONTANT (FCFA & %)	
Projet de soutien au changement climatique à la station d'épuration de Cambérène	FND	2 623 828 000	100%
	Total	2 623 828 000	100%

Délais / Entreprise	Date de notification OS	Date fin prévue	Date fin réelle
Grpt FI-GTHE	23 Juillet 2018	Février 2020	


Avancement des travaux	Prévisions	Réalisations	% Exécution
Electropompes (u)	06	00	00%
Canalisations PVC (ml)	10 000	9 698	93%
Bornes d'irrigation (u)	341	00	00%
Total Avancement Travaux			60%

Avancement. Financier / Entreprise	Prévisions	Réalisations	% Exécution
FI/GTHE (FCFA HT)	688 466 000	482 193 000	70%
Total Avancement Financier			70%

Taux d'avancement	Financier	Technique
	70%	60%

SITUATION D'EXECUTION DES PROJETS DU MOIS DE JUIN 2021

Difficultés/Observations	Plan d'action
<ul style="list-style-type: none"> - défaillance de l'entreprise FI/GTHE - Attente de plus 5 mois pour avoir l'ANO du FND sur la demande de prolongation de la convention de financement 	<ul style="list-style-type: none"> - Remobilisation de l'entreprise - Suivi planning d'achèvement des travaux transmis par l'entreprise

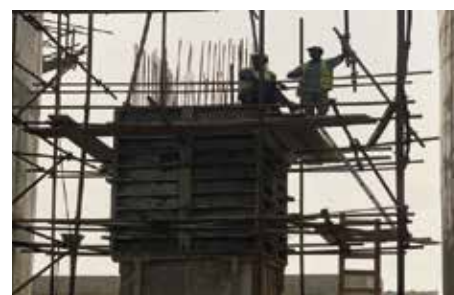

PROJET D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DE GRAND YOUFF

PROGRAMME	BAILLEUR	MONTANT (FCFA & %)	
Extension et de renforcement du système d'assainissement des eaux usées de la commune de Grand-Yoff	Coopération Espagne	1 871 877 950	100%
	Total	1 871 877 950	100%

Entreprise	Date de notification OS	Date fin prévue	Date fin réelle'
CSTP	11/06/2019	26/02/2021	

Avancement des travaux	Prévisions	Réalisations	% Exécution
Extension réseaux			
Fourniture et pose de conduite (ml)	4 384	4 068	92%
Branchements domiciliaires(u)	181	0	0%
Renouvellement réseaux			
Renouvellement de conduite DN 250 (ml)	13 535	9880	73%
Renouvellement collecteur DN 400 (ml)	1 900	124	7%
Branchements domiciliaires (u)	1 960	1227	62%
Total avancement travaux			47%

Avancement. Financier / Entreprise	Prévisions	Réalisations	% Exécution
CSTP (FCFA HT)	1 830 050 950	1 299 639 426	71%
Total Avancement Financier			71%

Taux d'avancement	Financier	Technique
	71%	47%

Difficultés	Plan d'action
Retard dans l'exécution des travaux. L'entreprise a transmis une lettre d'explication des causes du retard et demande une prolongation des délais de 3,5 mois	Proposition d'un avenant pour la finalisation des travaux est transmise au bailleur de fonds pour la prolongation des délais de 3 mois.



PROJET DE DEPOLLUTION NORD DE LA VILLE DE DAKAR

PROGRAMME	BAILLEUR	MONTANT (FCFA & %)	
Travaux de modernisation et d'extension de la station d'épuration de Cambérène	BID	20 198 409 420	100%
	Total	20 198 409 420	100%

LOT1

Délais / Entreprise-STEP	Date de notification OS	Date fin prévue	Date fin réelle
24 mois/Groupement INIMA/INCATEMA/SVTP	06/03/2019	31/12/2021	

SITUATION D'EXECUTION DES PROJETS DU MOIS DE JUIN 2021

Avancement des travaux	Prévisions	Réalisations	% Exécution
Travaux de modernisation et d'extension de la station d'épuration de Cambérène	100%	0,68	68%
Total avancement travaux			68%

Avancement. Financier / Entreprise	Prévisions	Réalisations	% Exécution
INIMA/INCATEMA/SVTP (FCFA HT)	20 198 409 420	12 460 521 353	62%
Total Avancement Financier			62%

Taux d'avancement	Financier	Technique
	62%	68%

LOT2

Délais / Entreprise-Emissaire	Date de notification OS	Date fin prévue	Date fin réelle
24 mois/Grpt SAMASA - RyG/CDE	31/08/2019	31/08/2021	

Avancement des travaux	Prévisions	Réalisations	% Exécution
Travaux de délocalisation de l'émissaire de la station d'épuration de Cambérène	100%	0,40	40%
Total avancement travaux			40%

Avancement. Financier / Entreprise	Prévisions	Réalisations	% Exécution
Grpt REDONDO – RyG-CDE (FCFA HT)	14 960 179 081	6 852 898 223	46%
Total Avancement Financier			46%

Taux d'avancement	Financier	Technique
	46%	40%

Difficultés/Observations	Plan d'action
<ul style="list-style-type: none"> - Non mobilisation de SAMASA pour le démarrage des activités de la partie maritime de l'émissaire - CDE s'est substituée à SAMASA et a déjà réalisé les investigations géotechniques et bathymétriques sur la partie maritime de l'émissaire. - Sous-traitance des travaux de la partie maritime de l'émissaire à INCATEAMA. 	<p>La procédure d'exécution des cautions de garantie de l'avance de démarrage de l'entreprise SAMASA/RyG a abouti à la récupération du montant total qui lui a été payé.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Achèvement des études d'exécution - Démarrage travaux émissaire marin.

PROJET D'ASSAINISSEMENT DE LA CORNICHE OUEST

PROGRAMME	BAILLEUR	MONTANT (FCFA & %)	
Renouvellement des réseaux de la Medina Gueule Tapée et Reubeuss	BADEA	5 000 000 000	90%
	Etat du Sénégal	1 000 000 000	10%
	Total	6 000 000 000	100%

Entreprise	Date de notification OS	Date fin prévue	Date fin réelle'
CSTP	26 Novembre 2019	30 Avril 2021	

Avancement des travaux	Prévisions	Réalisations	% Exécution
Réseaux eaux usées (ml)	49 000	19 500	40%
Regards de visite	1800	780	43%
Branchements domiciliaires (u)	3 182	830	26%
Voieries	79 000	29 323	37%
Total Avancement Travaux	-	-	37%
Total Avancement Financier	5 681 531 480	2 748 423 108	48%

Taux d'avancement	Financier	Technique
	48%	37%

Difficultés	Plan d'action
<ul style="list-style-type: none"> - Faible Rendement occasionné par le Covid 19 ralentissant à hauteur de 30% les activités du chantier (l'entreprise a déposé une réclamation vue les difficultés engendrées pour l'approvisionnement et le transport des fournitures, la disponibilité de la main d'œuvre, et la limitation des services administratifs ; 	<ul style="list-style-type: none"> - Quatre fronts de pose mobilisés au niveau de la Médina et Gueule Tapée ; - Deux ateliers de préfabrication (regards, rehausses, boîtes de branchements et tampons) mis en place (Base de Soumbédioune et Grand Yoff) ; - Deux (02) équipes de réfection provisoire de chaussées mobilisées

<ul style="list-style-type: none"> - L'Ageroute: une convention a été signé avec l'entreprise pour réfectionner à mi-chaussée occasionnant un coût supplémentaire de 498 190 231 FCFA soit 10% du montant du marché qui passe de 4 814 857 191 FCFA à 5 313 047 422 FCFA; - Retard de paiement de la contrepartie /TVA. 	<ul style="list-style-type: none"> de part et d'autre entre Médina et Gueule Tapée ; - Un avenant administratif est en cours d'élaboration pour prolonger la date prévisionnelle de fin des travaux au 30 janvier 2022 soit (07 mois supplémentaires).
---	--

SITUATION D'EXECUTION DES PROJETS DU MOIS DE JUIN 2021

ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES A ZIGUINCHOR PHASE PRIORITAIRE

PROGRAMME	BAILLEUR	MONTANT (F CFA)	%
Assainissement des eaux usées de Ziguinchor phase prioritaire	BAD	2 380 801 451	50%
	Etat du Sénégal	2 380 801 451	50%
	Total	4 761 602 902	100%

Entreprise- Lot 1	Date de notification OS	Date fin prévue	Date fin réelle
CSE	27 Juillet 2016	29 Novembre 2019	31 Décembre 2020

Avancement des travaux	Prévisions	Réalisations	% Exécution
Réseaux eaux usées (ml)	21 542	19 642	91%
Branchements (u)	1200	1030	86%
Station de pompage (u)	01	0,95	95%
Refoulement(ml)	1 930	1 930	100%
Bâtiment d'exploitation (u)	01	0,98	98%
Total Avancement Travaux			94%

Avancement. Financier / Entreprise	Prévisions	Réalisations	% Exécution
CSE (FCFA HTVA)	1 909 142 359	1 583 353 578	92%
Total Avancement Financier			92%

Taux d'avancement	Financier	Technique
	92%	94%

Difficultés/Observations	Plan d'action
<ul style="list-style-type: none"> - Longue attente autorisation de démolition et reconstruction des chaussées par AGEROUTE - Retard règlement de la caution pour les traversées de chaussées. - Occupations des emprises notamment au marché 	<ul style="list-style-type: none"> - Obtention autorisation AGEROUTE le 28 juin 2021 - Les travaux de démolition et réfection de chaussées sont réalisés à hauteur de 3%

Entreprise Lot 2	Date de notification OS	Date fin prévue	Date fin réelle
CHIALI	23 janvier 2017	31 Décembre 2020	

Avancement des travaux	Prévisions	Réalisations	% Exécution
Station de traitement (u)	01	0,03	3%
Bâtiment d'exploitation (u)	01	00	00%
Piste d'accès (ml)	1 115	736	66%
Total Avancement Travaux			04%

Avancement. Financier / Entreprise	Prévisions	Réalisations	% Exécution
CHIALI (FCFA HTVA)	3 185 305 678	1 113 384 000	35%
Total Avancement Financier			35%

Taux d'avancement	Financier	Technique
	35%	04%

Difficultés/Observations	Plan d'action
<ul style="list-style-type: none"> - résiliation du Marché de CHIALI, l'arrêté de résiliation signé par le MFB - Attribution nouveau marché soumis à la BAD. - est obtenu afin de pouvoir lancer l'appel d'offres. 	<ul style="list-style-type: none"> - Signature contrat cabinet de contrôle - ANO BAD - Signature marché et démarrage travaux - Suivi contentieux avec l'entreprise CHIALI

PROJET D'ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE SAINT-LOUIS

PROGRAMME	BAILLEUR	MONTANT (FCFA & %)	
Projet d'assainissement de la ville de Saint-Louis	BADEA	7 357 000 000	90%
	Etat du Sénégal	817 500 000	10%
	Total	8 175 000 000	100%

Délais / Entreprise	Date de notification OS	Date fin prévue	Date fin réelle
14 mois / SINCO/ LOT1	15 Novembre 2019	15 janvier 2021	-

Avancement des travaux	Prévisions	Réalisations	% Exécution
Réseau eaux usées (ml)	19 773	15 000	82%
Réseau eaux pluviales (ml)	2 500	1 500	60%
Branchements domiciliaires (u)	1 200	1 150	96%
Chaussée bitumineuses (m ²)	55 208	35 000	63%
Chaussée en pavé (m ²)	39 056	37 000	95%
Total Avancement Travaux			80%

Avancement. Financier / Entreprise	Prévisions	Réalisations	% Exécution
Réalisation financier (FCFA HT mille)	5 852 985 000	4 156 352 000	71%
Total Avancement Financier			71%

Taux d'avancement	Financier	Technique
	71%	80%

SITUATION D'EXECUTION DES PROJETS DU MOIS DE JUIN 2021



Entreprise	Date de notification OS	Date fin prévue	Date fin réelle
CGA-GEAUR :LOT2	15 Novembre 2019	15 janvier 2021	-

Avancement des travaux	Prévisions	Réalisations	% Exécution
Station de traitement (u)	01	0,37	37%
Piste d'accès (u)	01	00	00%
Total Avancement Travaux			37%

Avancement. Financier / Entreprise	Prévisions	Réalisations	% Exécution
CGA-GEAUR (FCFA HT)	1 440 028 780	474 499 286	33%
Total Avancement Financier			33%

Taux d'avancement	Financier	Technique
	33%	37%

Plan d'action

Les études sont à 98%.
L'ouvrage de déviation terminé
La clôture, le nettoyage des bassins et le terrassement en cours.

PROJET DE DEPOLLUTION DE LA BAIE DE HANN

PROGRAMME	BAILLEUR	MONTANT (FCFA HT/HD & %)	
Projet de dépollution de la baie de Hann	AFD	34 855 721 000	53%
	RVO (Pays Bays)	13 119 140 000	20%
	Union Européenne	9 117 802 300	14%
	Etat du Sénégal	8 199 462 500	13%
	Total	65 202 125 800	100%

TRAVAUX LOT 1 : REALISATION DE L'INTERCEPTEUR ET STATIONS DE POMPAGES

Délais / Entreprise	Date de notification OS	Date fin prévue	Date fin 'réelle'
PFEIFFER	Sans objet	Sans objet	

Consistance (unité)	Prévision	Réalisations	% Exécution
Réseaux eaux usées (ml)	13 515	1 500	11%
Station de relevage (u)	6	0	0%
Station de pompage (u)	1	0	0%
Conduites de refoulement (ml)	1 460	0	0%
Total Avancement travaux			07%

Avancement. Financier / Entreprise	Prévisions	Réalisations	% Exécution
Réalisation financier (FCFA HT)	15 506 871 722	4 367 713 737	28%
Total Avancement Financier			28%

Taux d'avancement	Financier	Technique
	28%	07%



SITUATION D'EXECUTION DES PROJETS DU MOIS DE JUIN 2021

ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE FATICK

PROGRAMME	BAILLEUR	MONTANT (FCFA-TTC & %)	
Assainissement des eaux usées et de drainage des eaux pluviales dans la Ville de FATICK - Phase prioritaire	BOAD	9 000 000 000	80,25%
	Etat du Sénégal	2 214 000 000	19,75%
	Total	11 214 000 000	100%

Délais / Entreprise – Lot1 : Ouvrages eaux usées	Date de notification OS	Date fin prévue	Date fin réelle
15 mois / Grpt CDE-SADE /Marché de base	15 novembre 2016	15 Février 2018	Fin Février 2021
4 mois / Grpt CDE-SADE /Avenant 1	18 avril 2019	18 Aout 2019	Fin Février 2021

Avancement des travaux /Marché de base	Prévisions	Réalisations	% Exécution
Réseaux eaux usées (ml)	21 466	21 466	100%
Branchements domiciliaires (u)	670	670	100%
Station de pompage (u)	02	02	100%
Conduites de refoulement (ml)	3 772	3 772	100%
Station d'épuration (u)	01	01	100%
Station Boues de vidange (u)	01	01	100%
Emissaire en mer (ml)	1 500	1 500	100%
Bâtiment Siège ONAS local (u)	01	01	100%
Total Avancement Travaux /Marché de base		100%	100%

Avancement des travaux /Avenant1	Prévisions	Réalisations	% Exécution
Réfection chaussées (ml)	2 353	2 235	95%
SP / Palplanches (u)	02	02	100%
Conduites de refoulement (ml)	560	560	100%
STEP / Remblais et Muret (u)	01	01	100%
STBV/Remblais (u)	01	01	100%
Total Avancement Travaux / Avenant 1			99%

Avancement. Financier / Entreprise	Prévisions	Réalisations	% Exécution
CDE-SADE/Marché de base (FCFA-TTC)	5 244 425 000	5 213 482 000	99,41 %
CDE-SADE/Avenant1 (FCFA-TTC)	1 212 943 000	949 006 000	78,24%
Total Avancement Financier (FCFA-TTC)	6 457 368 000	6 162 488 000	95%

Taux d'avancement	Financier	Technique
	95%	99%

Difficultés	Plan d'action
<ul style="list-style-type: none"> - Contrats des missions de supervision travaux et d'IEC arrivés à terme alors que les travaux sont toujours en cours. - Arriérés de paiement contrepartie Etat, entraînant lenteur des travaux. - Sur les 271 695 354 FCFA-HT d'arriérés de paiement de la contrepartie Etat, 156 000 000 FCFA-HT ont été payés en août 2020 et il reste un reliquat à payer de 115 695 354 FCFA-HT. - Le montant cumulé des droits de douane et taxes non encore remboursés à l'entreprise par l'Etat s'élève à 957 954 567 FCFA. 	<ul style="list-style-type: none"> - Assurer les missions de supervision travaux et d'IEC en interne par l'ONAS. - Diligenter le paiement des arriérés de factures au niveau du Trésor public

Délais / Entreprise-Lot2	Date de notification OS	Date fin prévue	Date fin réelle
12 mois/ Grpt CSE-SOSETER / Marché de base	15 novembre 2016	15 juillet 2018	31 juillet 2018
4 mois / Grpt CSE-SOSETER /Avenant 1	18 avril 2019	18 Aout 2019	31 Aout 2019

Avancement des travaux /Marché de base	Prévisions	Réalisations	% Exécution
Réseau eaux pluviales (ml)	6 500	6 500	100%
04 Bassins eaux pluviales (ff)	01	01	100%
Digue d'accès (ml)	150	150	100%
Total Avancement Travaux / Marché de base			100%

Avancement des travaux /Avenant1	Prévisions	Réalisations	% Exécution
Amélioration Réseau eaux pluviales avec canalisations PVC et regards avec grilles avaloires (56 u) / Réhabilitation d'une partie de la STAP EP existante (ff)	01	01	100%
Sécurisation des Bassins eaux pluviales avec mur de clôture et grillage (u)	04	04	100%
Total Avancement Travaux / Avenant 1			100%

Avancement. Financier / Entreprise	Prévisions	Réalisations	% Exécution
CSE-SOSETER /Marché de base (FCFA-TTC)	3 566 399 000	3 319 247 000	93,07%
CSE-SOSETER /Avenant1 (FCFA-TTC)	245 988 000	211 180 000	85,85%
Total Avancement Financier (FCFA-TTC)	3 812 387 000	3 530 427 000	92,60%

SITUATION D'EXECUTION DES PROJETS DU MOIS DE JUIN 2021

Taux d'avancement	Financier	Technique
	92,6%	100%

Difficultés	Plan d'action
<ul style="list-style-type: none"> Le montant cumulé des droits de douane et taxes non encore remboursés à l'entreprise par l'Etat s'élève actuellement à 556 887 323 FCFA. 	<ul style="list-style-type: none"> Diligenter le paiement des arriérés de factures au niveau du Trésor public.

Délais / Entreprise-Lot3	Date de notification OS	Date fin prévue	Date fin réelle
06 mois/ EBATI	09 janvier 2019	09 juillet 2019	

Avancement des travaux	Prévisions	Réalisations	% Exécution
Latrines double fosse (u)	120	103	85,84 %
Edicules publics double fosse (u)	05	02	40 %
Total Avancement Travaux		105	63 %

Avancement. Financier / Entreprise	Prévisions	Réalisations	% Exécution
EBATI (FCFA-TTC)	183 767 000	109 256 000	59,45%
Total Avancement Financier			70,89%

Taux d'avancement	Financier	Technique
	71%	63%

Difficultés	Plan d'action
<ul style="list-style-type: none"> Arriérés de paiement contrepartie Etat, entraînant lenteur des travaux. Le montant cumulé des droits de douane et taxes non encore remboursés à l'entreprise s'élève actuellement à 22 915 151 FCFA. 	<ul style="list-style-type: none"> Diligenter le paiement des arriérés de factures au niveau du Trésor public.

ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DE LA VILLE DE PIKINE /10 VILLES

PROGRAMME	BAILLEUR	MONTANT (FCFA HT/HD & %)	
Assainissement des dix villes / Assainissement des eaux usées de la ville de Pikine	Banques (BOAD/ BC)	1 856 346 734	90%
	Etat du Sénégal	206 260 748	10%
	Total	2 062 607 482	100%

Entreprise	Date de notification OS	Date fin prévue	Date fin 'réelle'
SVTP-GC /GEAUR	14 Aout 2018	Mars 2020	Septembre 2020

Consistance	Prévisions	Réalisations	% Exécution
Réseaux eaux usées (ml)	16 488	16 488	100%
Branchements domiciliaires (u)	1 500	1 552	103%
Station de pompage (Pikine Est)	01	01	100%
Edicules Publics (u)	50	50	98%
Total Exécution des travaux	100%		
Total Exécution financière(HT)	2 062 607 483	2 062 607 483	103%

Avancement. Financier / Entreprise	Prévisions	Réalisations	% Exécution
SATTAR	2 062 607 483	2 2062 607 483	100%

Taux d'avancement	Financier	Technique
	100%	103%

ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DE LA VILLE DE RUFISQUE / 10 VILLES

PROGRAMME	BAILLEUR	MONTANT (FCFA HT/HD & %)	
Assainissement des dix villes / Assainissement des eaux usées de la ville de Rufisque	Banques (BOAD/ BC)	3 580 669 935	90%
	Etat du Sénégal	397 852 215	10%
	Total	3 978 522 150	100%

Délais / Entreprise	Date de notification OS	Date fin prévue	Date fin 'réelle'
18 MOIS/SATTAR	20 Aout 2018	20 Février 2020	Décembre 2020

Avancement des travaux	Prévisions	Réalisations	% Exécution
Réseaux eaux usées (ml)	18 377	16 174	88%
Conduite PVC DN 160 mm	18 510	10 982	59%
Conduite de refoulement	1 344	1 274	95%
Branchements domiciliaires (u)	1 851	1 002	54%
Station de pompage (u)	01	01	95%
Réhabilitation Station pompage (u)	03	02	67%
Station d'épuration à renforcer	01	01	80%
Edicules Publics (u)	50	35	70%
Total Avancement Travaux			70%
Total Exécution financière(HT)	3 978 522 150	2 247 467 163	56,4

Taux d'avancement	Financier	Technique
	56%	70%

Difficultés/Observations

- Travaux à l'arrêt suite à des difficultés financières de l'entreprise.

ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DE LA COMMUNE DE CAMBERENE / 10 VILLES

PROGRAMME	BAILLEUR	MONTANT (FCFA HT/HD & %)	
Assainissement des dix villes / Assainissement des eaux usées de la ville de Cambéréne	Banques (BOAD/ BC)	3 161 494 783	90%
	Etat du Sénégal	351 277 198	10%
	Total	3 512 771 981	100%

Délais / Entreprise	Date de notification OS	Date fin prévue	Date fin 'réelle'
18 MOIS/SATTAR	20 Aout 2018	20 Février 2020	Décembre 2020

Consistance (unité)	Prévisions	Réalisations	% Exécution
Réseaux eaux usées (ml)	23 813	17 722	74%
Branchements domiciliaires(u)	3 000	2 062	69%
Station de pompage SPC1	01	GC : 100%. Equip : 0%	80%
Station de pompage SPC2	01	GC : 0%. Equip : 0%	0%
Edicules Scolaires	50	35	70%
Total Avancement travaux		65%	

Avancement. Financier / Entreprise	Prévisions	Réalisations	% Exécution
SATTAR	3 512 771 981	1 031 701 131	29,37%
Total Avancement Financier			29,37%

Taux d'avancement	Financier	Technique
	29,3%	65%



Difficultés/Observations

Les Travaux ont repris uniquement au niveau de la route Ndiaga MBAYE où l'Entreprise a terminé les travaux de pose du collecteur et des branchements. Les travaux de réfection sont en cours. Il reste 3800ml de pose de réseau concernant essentiellement des traversées de chaussées

ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DE LA VILLE DE LOUGA /10 VILLES

PROGRAMME	BAILLEUR	MONTANT (FCFA HT/HD & %)	
Assainissement des dix villes / Assainissement des eaux usées de la ville de Louga	Banques (BOAD/ BC)	4 048 541 883	90%
	Etat du Sénégal	449 837 987	10%
	Total	4 498 379 870	100%

Délais / Entreprise	Date de notification OS	Date fin prévue	Date fin 'réelle'
GC/ GEAUR	30 Octobre 2017	30 Avril 2019	Aout 2020

Consistance (unité)	Prévisions	Réalisations	% Exécution
Installation de chantier et repli	01	1	100%
Réseaux eaux usées (ml)	22000	22913	104,15%
Branchements domiciliaires(u)	1 400	1402	100,14%
Station de pompage SP2	01		100%
Station de pompage SPO	01		100%
Station de pompage P1GL	01		100%
Réhabilitation Station de pompage P1VL	01		100%
Réhabilitation Station de traitement	01		100%
Déposante de Boues de Vidange	01		100%
Edicules Scolaires	50	50 achevés	100%
Total Avancement des travaux			100%
Total Avancement financier			100%

Taux d'avancement	Financier	Technique
	100%	100%

ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DE LA VILLE DE ST-LOUIS/10 VILLES

PROGRAMME	BAILLEUR	MONTANT (FCFA HT/HD & %)	
Assainissement des dix villes / Assainissement des eaux usées de la ville de Saint-Louis	Banques (BOAD/ BC)	8 887 549 953	90%
	Etat du Sénégal	987 505 550	10%
	Total	9 875 055 503	100%

Délais / Entreprise	Date de notification OS	Date fin prévue	Date fin 'réelle'
RCC SA/RCC SENEGAL	16 Aout 2018	16 Mars 2020	Janvier 2021

Consistance (unité)	Prévisions	Réalisations	% Exécution
Etudes, Installations de chantier et logistique	01	0,8	80%
Réseaux eaux usées (ml)	53 496	48 238	90%
Branchements domiciliaires (u)	3 862	3 149	82%
Station de pompage (u)	10	08	80%
Réhabilitation Station pompage (u)	02	02	100%
Déposante de Boues (m3/jour)	75	0	69%
Edicules Publics (u)	50	50	99%
Total Exécution des travaux			85%

Avancement. Financier / Entreprise	Prévisions	Réalisations	% Exécution
RCC SA/RCC SENEGAL	9 875 055 503	7 094 963 807	70%
Total Avancement Financier			70%

Taux d'avancement	Financier	Technique
	70%	85%

Difficultés	Plan d'action
<ul style="list-style-type: none"> - Réduction de 25% des travaux due à un déficit de financement ; - Fin des prestations de la mission d'IEC ; - branchements clandestins dans le réseau d'eaux pluviales de Pikine créant des difficultés dans la pose des conduites. 	Sans objet

ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DE LA VILLE DE TIVAOUANE / 10 VILLES

PROGRAMME	BAILLEUR	MONTANT (FCFA HT/HD & %)	
Assainissement des dix villes / Assainissement des eaux usées de la ville de Tivaouane	Banques (BOAD/ BC)	3 309 370 818	90%
	Etat du Sénégal	367 707 979	10%
	Total	3 677 078 797	100%

Délais / Entreprise	Date de notification OS	Date fin prévue	Date fin 'réelle'
RCC SA/RCC SENEGAL	01 Aout 2018	01 Mars 2020	

Consistance (unité)	Prévisions	Réalisations	% Exécution
Etudes, Installations de chantier et logistique	01	1	90%
Réseaux eaux usées (ml)	16 500	18 347	111,19%
Branchements domiciliaires (u)	1558	827	100%
Station de pompage (u)	02	04	180%
Station d'épuration (m3/jour)	2099	0	100%
Edicules Publics (u)	50	50	100%
Total Avancement des travaux			99,9%

Avancement. Financier / Entreprise	Prévisions	Réalisations	% Exécution
RCC SA/RCC SENEGAL	3 677 078 797	3 674 075 505	99,9
Total Avancement Financier			99,9%

Taux d'avancement	Financier	Technique
	99%	99%

Difficultés	Plan d'action
<ul style="list-style-type: none"> - Il ne reste que la fourniture des compteurs électriques par la Senelec ; - Avenant des travaux du quartier El Hadji Malick SY en cours d'approbation au niveau du MEF ; - Attente du début des travaux d'avenant pour débiter la pose des équipements électromécaniques 	<ul style="list-style-type: none"> - la réception provisoire des travaux contractuels est prévue au courant du mois de Septembre ;

ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DE LA VILLE DE KAOLACK / 10 VILLES

PROGRAMME	BAILLEUR	MONTANT (FCFA HT/HD & %)	
Assainissement des dix villes / Assainissement des eaux usées de la ville de Kaolack	Banques (BOAD/ BC)	8 590 505 121	90%
	Etat du Sénégal	954 500 569	10%
	Total	9 545 005 690	100%

Délais / Entreprise	Date de notification OS	Date fin prévue	Date fin 'réelle'
SINCO-SPA	07 Août 2018	07 Février 2020	19 juillet 2021

Consistance (unité)	Prévisions	Réalisations	% Execution
Réalisation de collecteurs de drainage (ml)	6980	3774,3	54%
Reprofilage Talweg de la bande d'Aouzou (ml)	3567	999	28 %
Grille en fonte D 400 pour regard avaloir (40x40)	195	32	16.41%
Réalisation de bassin d'écrêtage (U)	02	1,95	97,5%
Réalisation de voiries neuves en pavés (ml)	695	0	0%
Réalisation de chaussée en bitume de 6 m (ml)	6602	0	0%
Édicules publics (u)	50	50	100%
Total Exécution des travaux		70%	
Total Exécution financière (HT)	9 556 940 248	4 120 676 112	43,11%

Avancement. Financier / Entreprise	Prévisions	Réalisations	% Exécution
SINCO-SPA	9 556 940 248	4 120 676 112	43,11%
Total Avancement Financier			43,11%

Taux d'avancement	Financier	Technique
	43,11%	70%

Difficultés/Observations	Plan d'action
- Les travaux sur certains sites sont impraticables.	Un système de pompage d'un débit de 1200 m3/h est mis en place avec deux pompes

ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES DE TOUBA /10 VILLES

PROGRAMME	BAILLEUR	MONTANT (FCFA HT/HD & %)	
Assainissement des dix villes / Assainissement des eaux usées de la ville de Touba	Banques (BOAD/ BC)	6 945 053 640	90%
	Etat du Sénégal	771 672 626	10%
	Total	7 716 726 266	100%

Délais / Entreprise	Date de notification OS	Date fin prévue	Date fin 'réelle'
Groupement RC Construcoes.	23 novembre 2018	23 mai 2020	23 octobre 2020

Consistance (unité)	Prévisions	Réalisations	% Exécution
Réseaux eaux usées (ml)	26 108	24 299	85%
Branchements domiciliaires (u)	1500	1 356	73%
Station de pompage (u)	6	en cours	75%
Station de relevage	2	0	0%
Station d'épuration (3600 m3/jour)	1	0	95%
Édicules publics (u)	50	50	100%
Total Exécution des travaux		86%	
Total Exécution financière (HT)	8 230 953 682	5 570 657 154	67,67%

Avancement. Financier / Entreprise	Prévisions	Réalisations	% Exécution
Groupement RC Construcoes	8 230 953 682	5 570 657 154	67,67%
Total Avancement Financier			67,67%

Taux d'avancement	Financier	Technique
	67,7%	84%

Difficultés/Observations
<ul style="list-style-type: none"> - Le site d'implantation de la station de relevage SR1 n'est toujours pas acquis ; - Un réaménagement du réseau est en cours pour couvrir, en partie, le village central de Touba mosquée

ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DE LA VILLE DE MATAM / 10 VILLES

PROGRAMME	BAILLEUR	MONTANT (FCFA HT/HD & %)	
Assainissement des dix villes / Assainissement des eaux usées de la ville de Matam	Banques (BOAD/ BC)	5 320 575 379	90%
	Etat du Sénégal	591 175 042	10%
	Total	5 911 750 421	100%

Entreprise	Date de notification OS	Date fin prévue	Date fin 'réelle'
CDE	18/07/2018	18/10/2019	Décembre 2020

Consistance (unité)	Prévisions	Réalisations	% Exécution
Réseaux eaux usées (ml)	15 779	17 178	108,86%
Branchements domiciliaires(u)	1 000	1002	51,5%
Station de pompage 1	01	GC 100%,	98%
Station de pompage 2	01	GC 100%,	98%
Conduites de refoulement (ml) 1	1632	1308	100%
Conduites de refoulement (ml) 2	629	614	100%
Station de traitement	01	93%	90%
Piste d'accès (ml)	1200	1200	100%
Édicules Scolaires	29	29	100%
Total Exécution des travaux		98%	
Total Exécution financière (HT)	5 573 331 682	4 462 020 431	80%

Avancement. Financier / Entreprise	Prévisions	Réalisations	% Exécution
CDE	5 573 331 682	4 462 020 431	80%
Total Avancement Financier (HT)			80%

Taux d'avancement	Financier	Technique
	80%	98%

Difficultés/Observations	Plan d'action
- Dégradation de la chaussée (cf. Agéroute)	- Engager la procédure de réparation sans incidence financière

ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DE TAMBACOUNDA / 10 VILLES

PROGRAMME	BAILLEUR	MONTANT (FCFA HT/HD & %)	
Assainissement des dix villes / Assainissement des eaux usées de la ville de Tambacounda	Banques (BOAD/ BC)	4 222 900 988	90%
	Etat du Sénégal	469 211 220	10%
	Total	4 692 112 208	100%

Délais / Entreprise	Date de notification OS	Date fin prévue	Date fin 'réelle'
SVTP/GEAUR	11/07/2018	11/09/2019	Octobre 2020

Consistance (unité)	Prévisions	Réalisations	% Exécution
Réseaux eaux usées (ml)	34 408	39 058	115%
Branchements domiciliaires(u)	1 200	1 100	85,41%
Station de pompage (u)	01	GC à 100%	100%
Conduites de refoulement (ml)	2 241	2 146	100%
Station de traitement	01	01	100%
Piste d'accès (ml)	1 284	1284	100%
Édicules Scolaires	50	50	100%
Total Exécution des travaux		99%	

Avancement. Financier / Entreprise	Prévisions	Réalisations	% Exécution
SVTP/GEAUR	6 257 059 609	4 495 120 375	72%
Total Avancement Financier			72%

Taux d'avancement	Financier	Technique
	72%	99%

Observations
- LES TRAVAUX RESTANTS CONCERNENT LES TRAVERSEES DE CHAUSSEES NON ENCORE DEMARRES



ENAS

L'assainissement pour un meilleur cadre de vie
